5000

CHURCH CROOKHAM Package 5b

Hope & Clay (Construction) Ltd

13/05/13
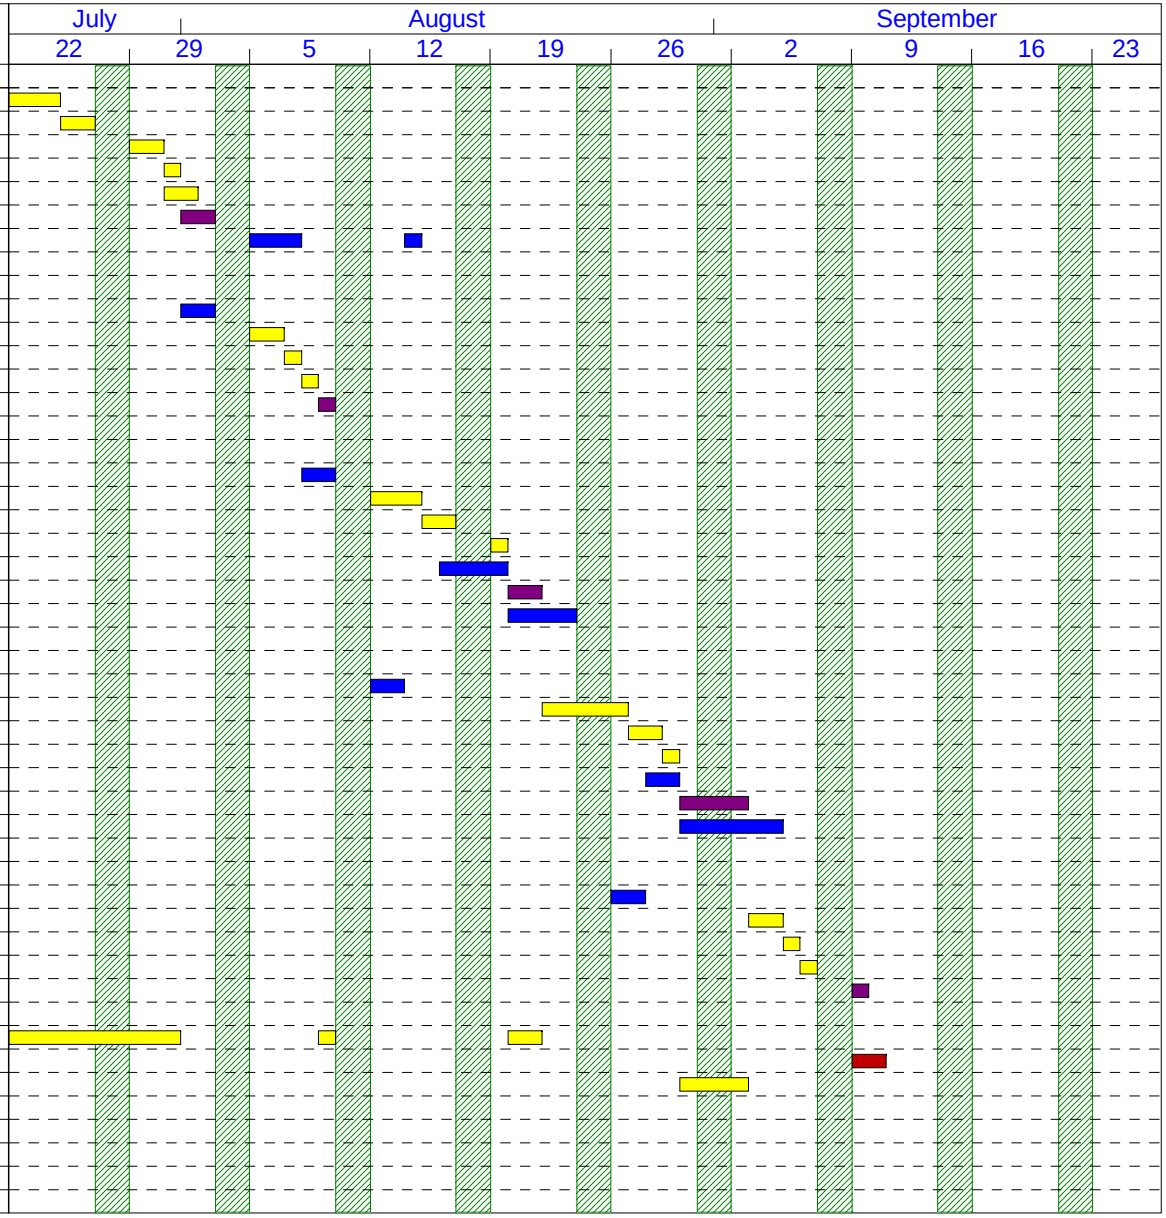
ID	Name	Start	Duration	Finish
1	**School Entrance Speed Table**			
2	Breakout existing road	22/07/13	3d	24/07/13
3	Install gullies	25/07/13	2d	26/07/13
4	Kerb alterations	29/07/13	2d	30/07/13
5	Shape stone to formation	31/07/13	1d	31/07/13
6	Adjust ironwork	31/07/13	2d	01/08/13
7	Asphalt surfacing	01/08/13	2d	02/08/13
8	Tactile paving	05/08/13	4d	14/08/13
9				
10	**Speed Table @ Number 31**			
11	Install new gullies	01/08/13	2d	02/08/13
12	Breakout existing road	05/08/13	2d	06/08/13
13	Shape stone to formation	07/08/13	1d	07/08/13
14	Adjust ironwork	08/08/13	1d	08/08/13
15	Asphalt surfacing	09/08/13	1d	09/08/13
16				
17	**Oaken Close Speed Table**			
18	Install new gullies	08/08/13	2d	09/08/13
19	Breakout existing road	12/08/13	3d	14/08/13
20	Kerb alterations	15/08/13	2d	16/08/13
21	Shape stone to formation	19/08/13	1d	19/08/13
22	Adjust ironwork	16/08/13	2d	19/08/13
23	Asphalt surfacing	20/08/13	2d	21/08/13
24	Tactile paving	20/08/13	4d	23/08/13
25				
26	**Cadet Way Speed Table**			
27	Install new gullies	12/08/13	2d	13/08/13
28	Breakout existing road	22/08/13	3d	26/08/13
29	Kerb alterations	27/08/13	2d	28/08/13
30	Shape stone to formation	29/08/13	1d	29/08/13
31	Adjust ironwork	28/08/13	2d	29/08/13
32	Asphalt surfacing	30/08/13	2d	02/09/13
33	Tactile paving	30/08/13	4d	04/09/13
34				
35	**Speed Table @ Number 31**			
36	Install new gullies	26/08/13	2d	27/08/13
37	Breakout existing road	03/09/13	2d	04/09/13
38	Shape stone to formation	05/09/13	1d	05/09/13
39	Adjust ironwork	06/09/13	1d	06/09/13
40	Asphalt surfacing	09/09/13	1d	09/09/13
41				
42	Kerb buildout	22/07/13	11d	21/08/13
43	Linemarking	09/09/13	2d	10/09/13
44	New signs	30/08/13	2d	02/09/13
45				
46				
47				
48				
49
